

FAZOWANIE

Wersja 10.12.2019r.


Roboty wyprzedzające 01.09.2019r. - 12.02.2020r.

ZGIERZ


LÓDŹ ŻABIENIEC

- rozbiorka
- budowa
- wykonane

FAZA 0A 01.09.2019r.-
28.10.2019r.

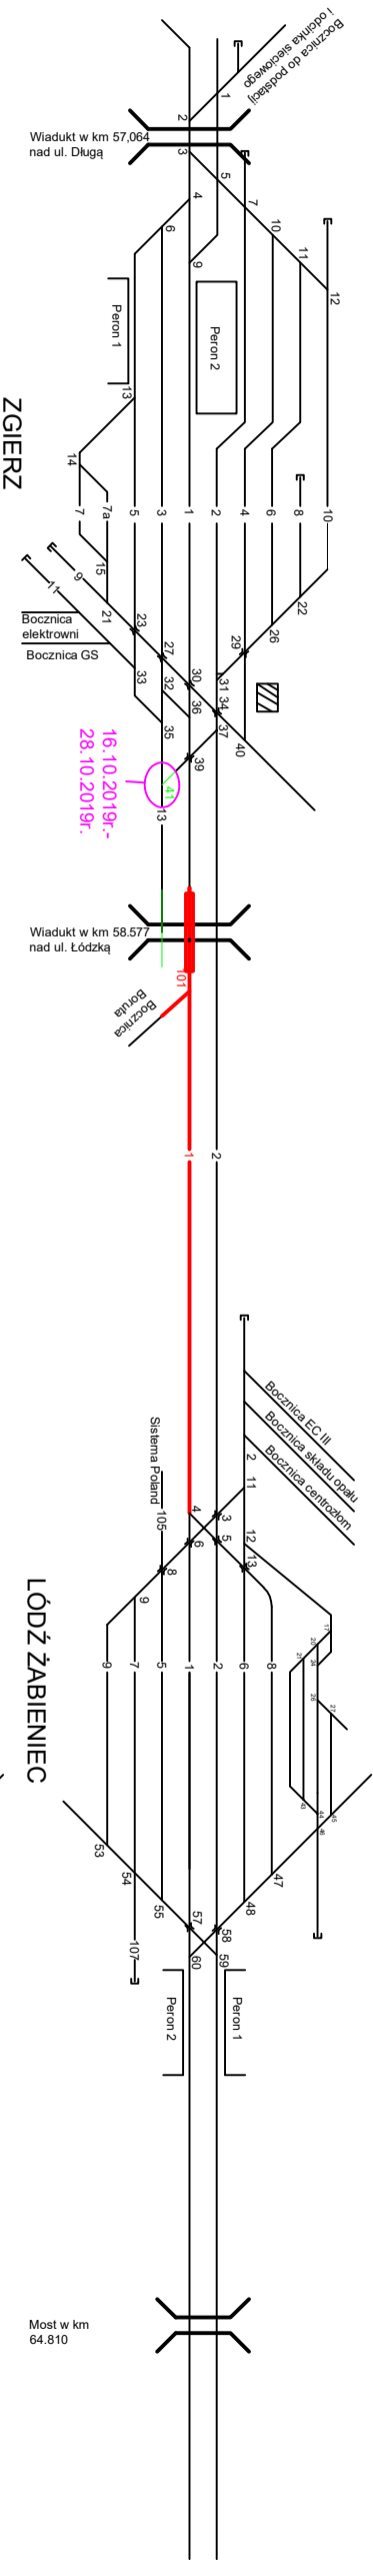

FAZA 0B 29.10.2019r.-
12.02.2020r.

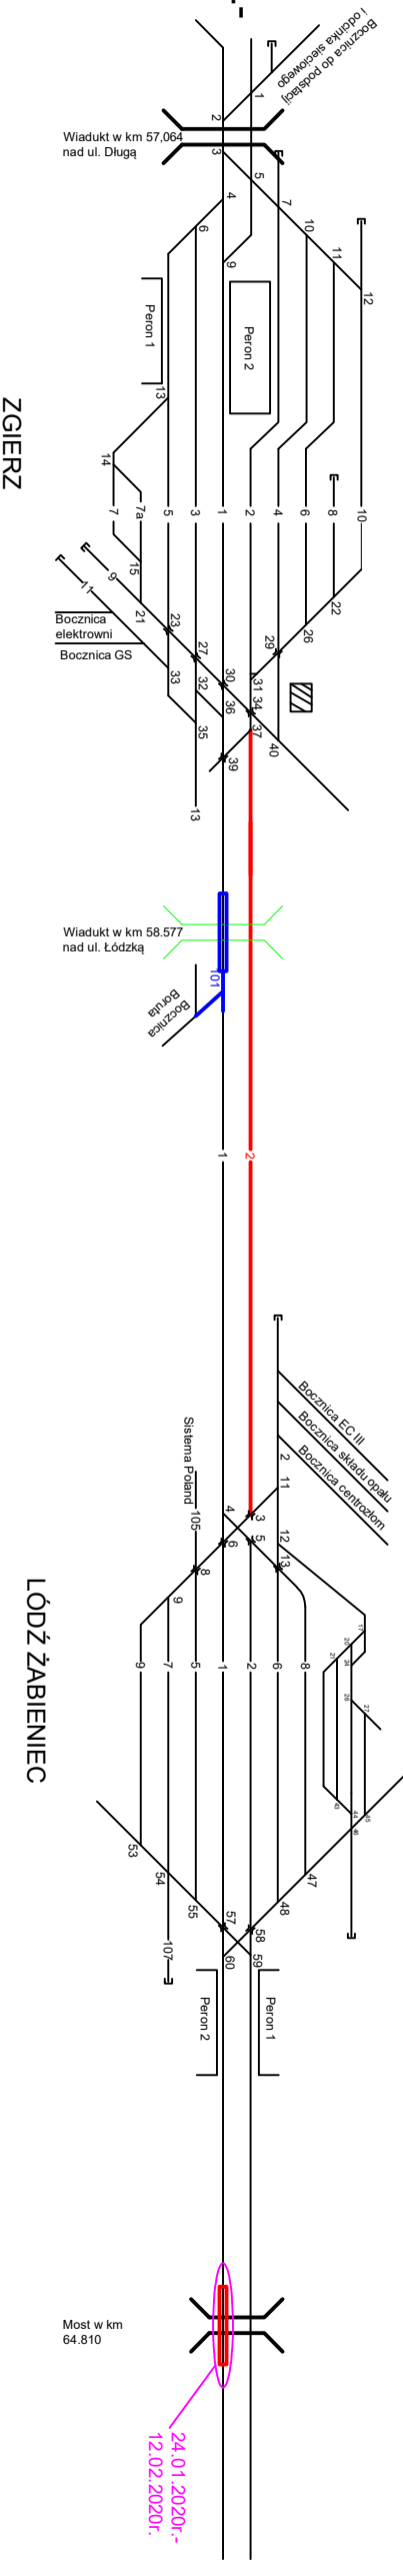

FAZA 0C 07.01.2020r.-
12.02.2020r.

